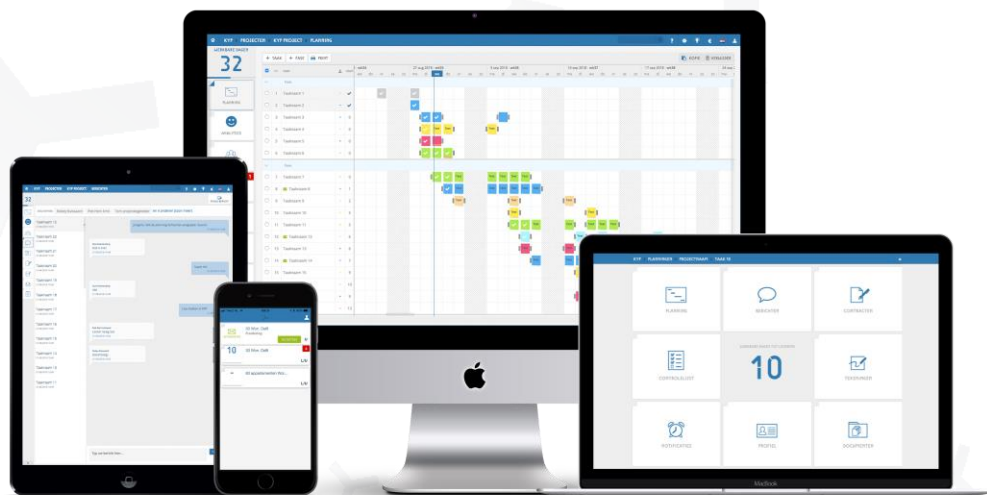


KYP PROJECT

PLAN ✎ VERBIND ✎ VERBETER

Handleiding KYP Analytics



Succes en KYP-ze!

Inhoudsopgave



↳ KYP Analytics	p. 3
↳ KYP Factor	p. 4
↳ Grafiek	p. 5
↳ Grafiek – KYP Factor	p. 6
↳ Tabellen	p. 7
↳ Projectdeelnemers	p. 9

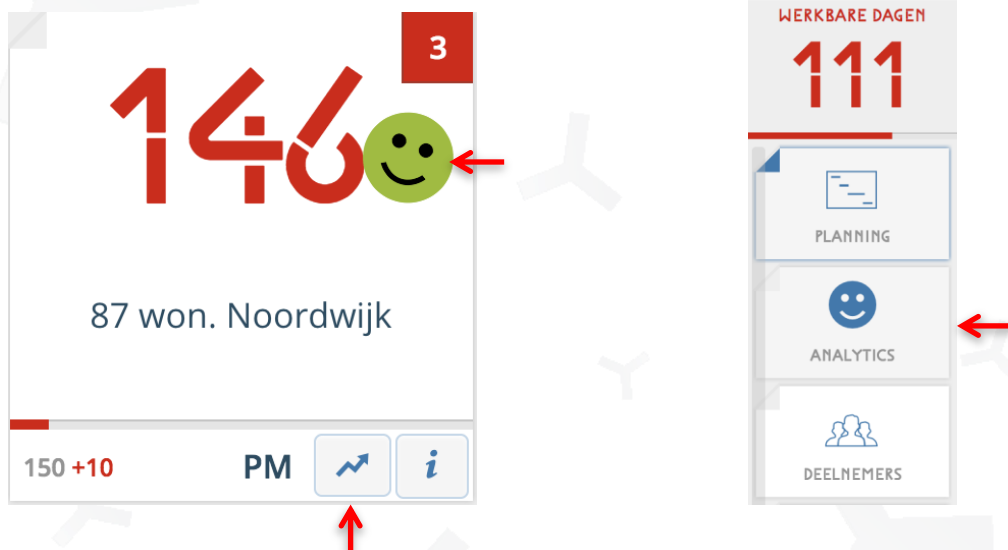


Met KYP Analytics krijg je continu actuele data en inzichten van jouw project.

KYP Analytics is een extra dienst waarvoor je kan kiezen bij het activeren van het project. Heb je een KYP-licentie? Dan mag je KYP Analytics gratis gebruiken.

KYP Analytics is op drie manieren te bereiken:

- ↪ Via de smiley (groen of rood) op de projecttegel in jouw projectoverzicht
- ↪ Via de pijl-knop rechts onderin de projecttegel
- ↪ Via de smiley in het 7 knoppen menu in de planning



KYP Factor

De KYP Factor is het getal links bovenin in KYP Analytics. Het getal kan lopen tussen de 0 en de 100 en geeft aan wat de kans is dat het project op tijd wordt opgeleverd.

Hoe wordt dit berekend?

- ↳ Het aantal te laat gereed gemelde post-its ten opzichte van wat gereed had moeten zijn, in relatie tot het totaal aantal post-its.

Het getal is een dynamisch getal en verandert met de dag. Wanneer het project minder goed gaat dan gister, wordt het getal rood. Dit kan dus bijvoorbeeld wanneer er post-its niet op tijd zijn afgevinkt.

Gaat het beter dan gisteren, dan stijgt het getal en verandert het weer naar groen.

KYP > PROJECTEN > 9092 69 APP RIJSWIJK > ANALYTICS BEDRIJVEN				?	⚙	💡	€	🇳🇱	👤
9092 69 app Rijswijk									
KYPFACTOR ⓘ		GEPLAND - ACTUEEL ⓘ				PROJECT DETAILS ⓘ			
87 ▲		<i>Start</i>	06/07/2017	→	06/07/2017	▼	0d	<i>PM</i>	Alfred Jakobs, Jordi van Houdt, Theo van Kalmthout...
		<i>Gereed</i>	23/11/2018	→	14/01/2019	▲	52d	<i>Contract</i>	362
		<i>Duur</i>	326	→	362	▲	11%		

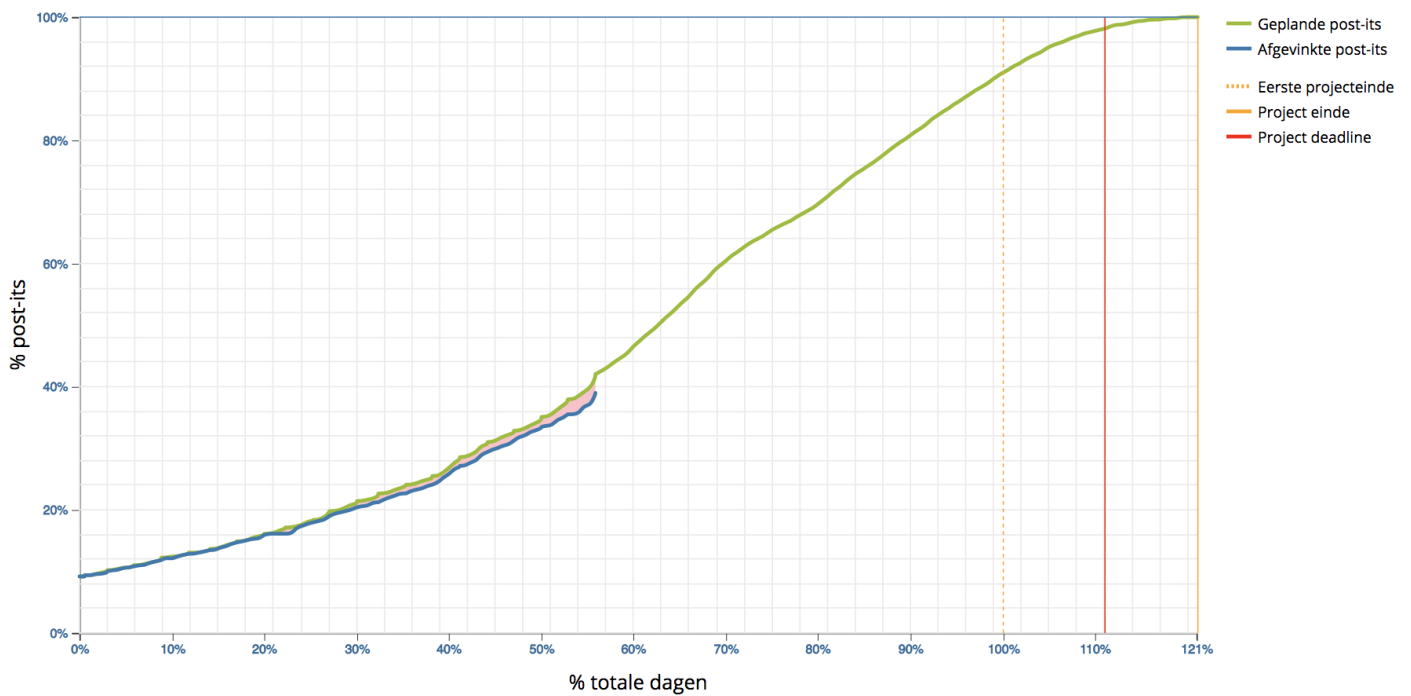


Grafiek

Deze grafiek laat je de ontwikkeling van het project zien. Het verschil tussen de groene lijn en de blauwe lijn is de achterstand. Een achterstand in afgevinke post-its en daarmee de achterstand in het hele project.

- ↪ De gele stippellijn laat het originele projecteinde zien, hoe er oorspronkelijk is gepland.
- ↪ De gele dichte lijn laat zien waar het projecteinde nu op uitkomt mede door vertraging in de post-its
- ↪ De rode lijn laat de vooraf opgestelde projectdeadline zien.

GEPLANDE EN AFGEVINKTE POST-ITS

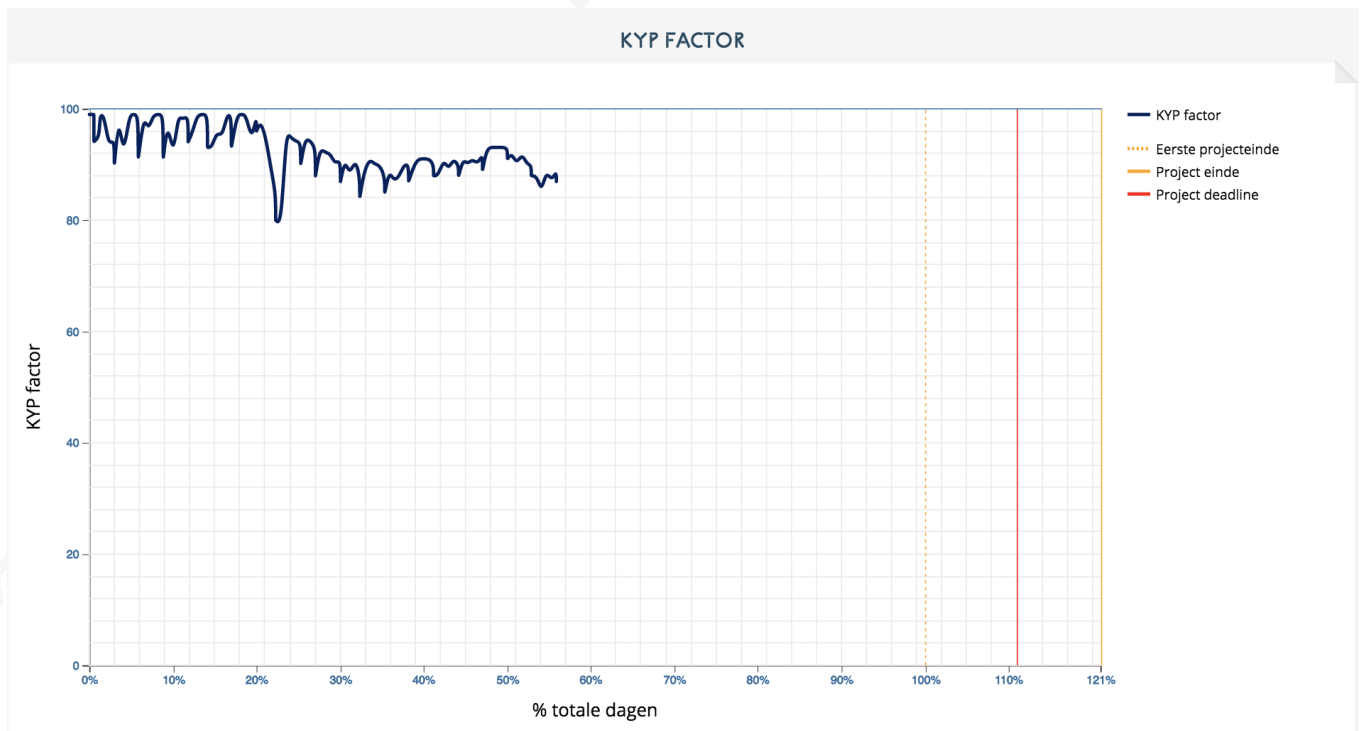


Grafiek – KYP Factor



De KYP Factor ontwikkelt zich naarmate de post-its worden afgevinkt.

De grafiek, zoals hieronder afgebeeld, toont het verloop hoe goed de projectpartners hun post-its afvinken.






Tabellen

Naast de grafieken geeft KYP Analytics in de tabellen informatie over de voortgang van taken, post-its en dagen.

↳ Gereed geeft aan hoeveel:

- ↳ Taken er geaccepteerd zijn, met eventueel een goedgekeurde controlelijst
- ↳ Post-its er zijn afgevinkt en hoeveel er totaal in de planning staan
- ↳ Werkbare dagen er al verstreken zijn en het totaal aantal werkbare dagen tot projecteinde


• Gereed

PERCENTAGE	TYPE	0%	50%	100%	AANTAL	TOTAAL
44%	Taken <i>i</i>				202	462
39%	Post-its <i>i</i>				2011	5112
69%	Dagen <i>i</i>				251	362

De tweede tabel de hoeveel acties zien die te laat zijn opgevolgd. Namelijk:

- ↳ Hoeveel taken er al gereed gemeld hadden moeten zijn
- ↳ Post-its al afgevinkt hadden moeten worden

• Te laat



PERCENTAGE	TYPE	0%	50%	100%	AANTAL	TOTAAL
2%	Taken <i>i</i>				7	462
3%	Post-its <i>i</i>				153	5112

Tabellen

De tabel 'Te laat gereed' geeft aan hoeveel:


- ↳ Taken die te laat zijn geaccepteerd, inmiddels wel zijn geaccepteerd
- ↳ Post-its die te laat zijn afgevinkt, inmiddels wel zijn afgevinkt

● Te laat gereed

PERCENTAGE	TYPE	0%	50%	100%	AANTAL	TOTAAL
37%	Taken ⓘ				171	462
32%	Post-its ⓘ				1622	5112


- ↳ De tabel 'Te laat akkoord' geeft het aan taken aan waarvan de controlelijst te laat is geaccepteerd, na het verlopen van de laatste post-it

● Te laat akkoord

PERCENTAGE	TYPE	0%	50%	100%	AANTAL	TOTAAL
43%	Taken ⓘ				198	462

- ↳ 'Akkoord zonder controlelijst' geeft aan hoeveel taken er geaccepteerd zijn zonder gebruik te maken van de controlelijst

● Akkoord zonder controlelijst

PERCENTAGE	TYPE	0%	50%	100%	AANTAL	TOTAAL
44%	Taken ⓘ				202	462

Projectdeelnemers

In het linker menu van KYP Analytics vind je onderaan het Fabriek-symbool. Wanneer je op dit symbool klikt zie je alle prestaties van de projectpartners die zijn toegevoegd aan het project.

- ↪ Zie hoeveel taken ze in het project hebben
- ↪ Hoeveel taken daarvan te laat zijn gereed gemeld
- ↪ Hoeveel post-its ze te laat hebben afgevinkt

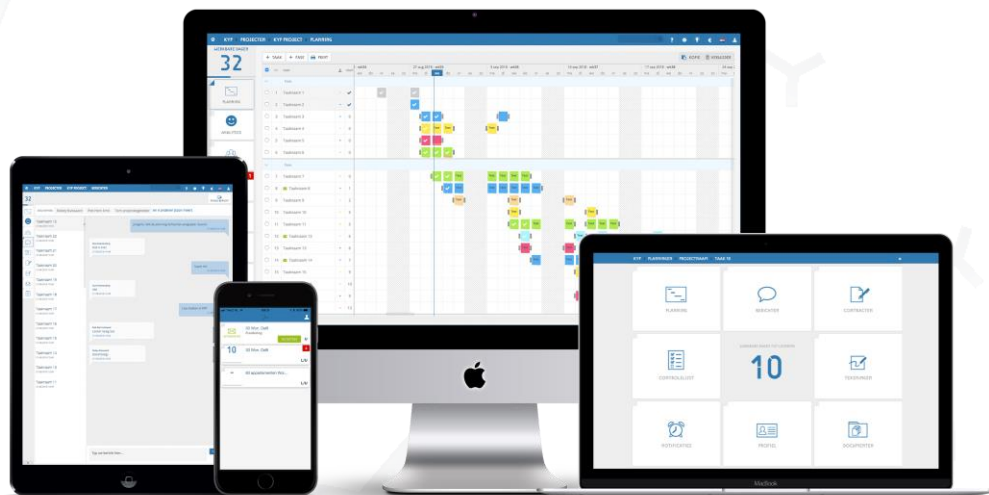


VERANTWOORDELIJKEN	BEDRIJF	TAKEN	TAKEN TE LAAT	DAGEN	POST-ITS	POST-ITS TE LAAT
Bas [redacted]	KYP bv	3	1 33%	0	66	23 35%
Project Manager	KYP Bouwbedrijf B.V.	4	1 25%	7	8	1 12%
Piet uitvoerende	KYP Bouwbedrijf B.V.	2	0 0%	0	16	10 62%

KYP PROJECT

PLAN > VERBIND > VERBETER

Succes en KYP-ze!



Download meer handleidingen op de website!
